

2025

Relatório de Gerenciamento Semanal




1. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO

- SEGUNDA-FEIRA – 26/05/2025



**Instalação das evaporadoras e condensadoras
(câmara fria congelados)**

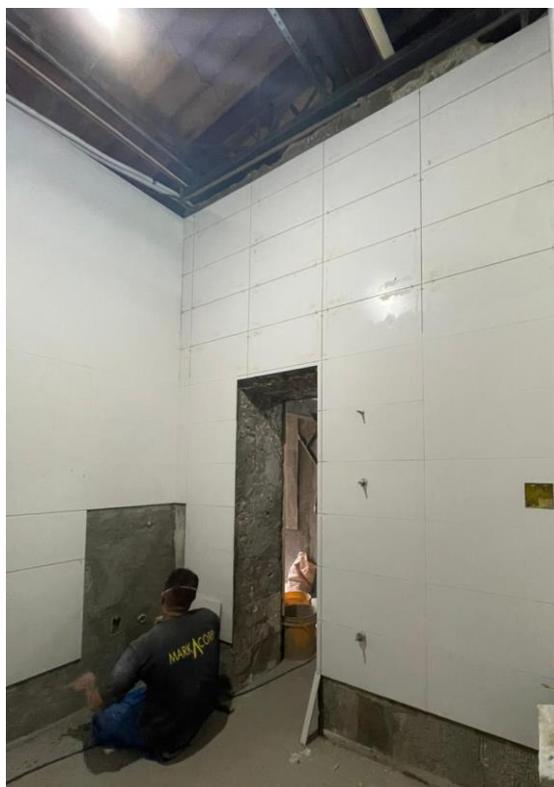

**Finalização revestimento parede
(açougue)**

- TERÇA-FEIRA – 27/05/2025



Impermeabilização na área de preparo



Instalação de revestimento na área de estoque seco

- QUARTA-FEIRA - 28/05/2025



Finalização do revestimento do piso do estoque seco



Instalação das “chaminés” das coifas e exaustão

- QUINTA-FEIRA – 29/05/2025



Assentamento de revestimento nas paredes



Instalação de caixilho nas janelas internas


- SEXTA-FEIRA – 30/05/2025



Montagem dos quadros de comando e instalação da camada isolante do piso das câmaras frias



Finalização da instalação das coifas

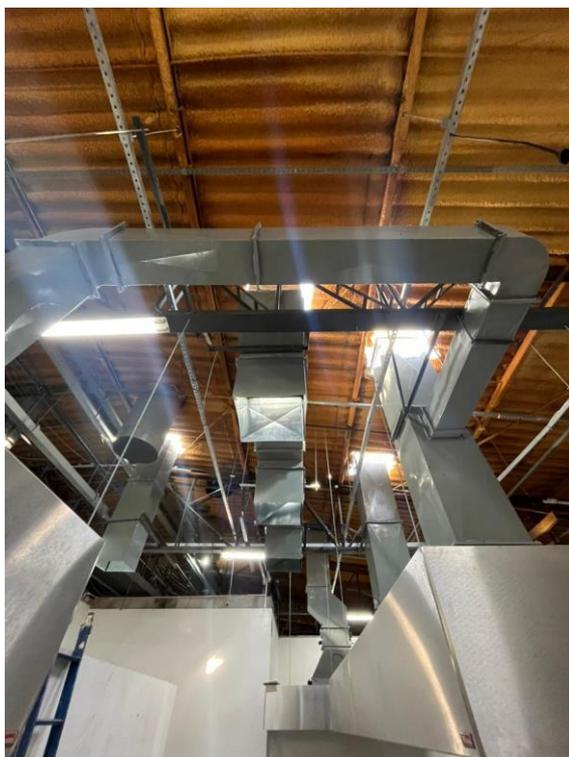

Finalização da tubulação de exaustão das coifas e insuflamento

- SÁBADO – 31/05/2025 – SEM EXPEDIENTE

2. PONTOS DE ANÁLISE / PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS

- Passado as orientações para concretagem do piso das câmaras frias à MARKA para providencias dos materiais junto a SPAC.
- Definição da contratação dos equipamentos da Rebal faltantes pela SPAC
- Liberação das tubulações da TR Metal para vedação por parte da equipe de manutenção da SPAC

3. CRONOGRAMA DE EVOLUÇÃO FÍSICA-FINANCEIRA

Cronograma físico-Financeiro executivo em anexo com as informações que temos até o momento.

4. OCORRÊNCIAS DA OBRA

- a)** 26/05: Montagem da câmara fria, assentamento de revestimento de parede e piso.
- b)** 27/05: Montagem da câmara fria, instalação de compressores da câmara fria, assentamento de piso do estoque seco.
- c)** 28/05: Início da instalação do sistema de insuflamento e exaustão das coifas, abertura de telhado para passagem da tubulação de exaustão e insuflamento, montagem da parte interna da câmara fria, finalização do assentamento de piso do estoque seco, impermeabilização da área de preparo.
- d)** 29/05: Instalação do sistema de insuflamento e exaustão das coifas, assentamento de revestimento de pisos e paredes, instalação de vidros e janelas internas, montagem da câmara fria.
- e)** 30/05: Montagem dos quadros de comando e isolamento do piso, instalação de coifas na área de preparo.
